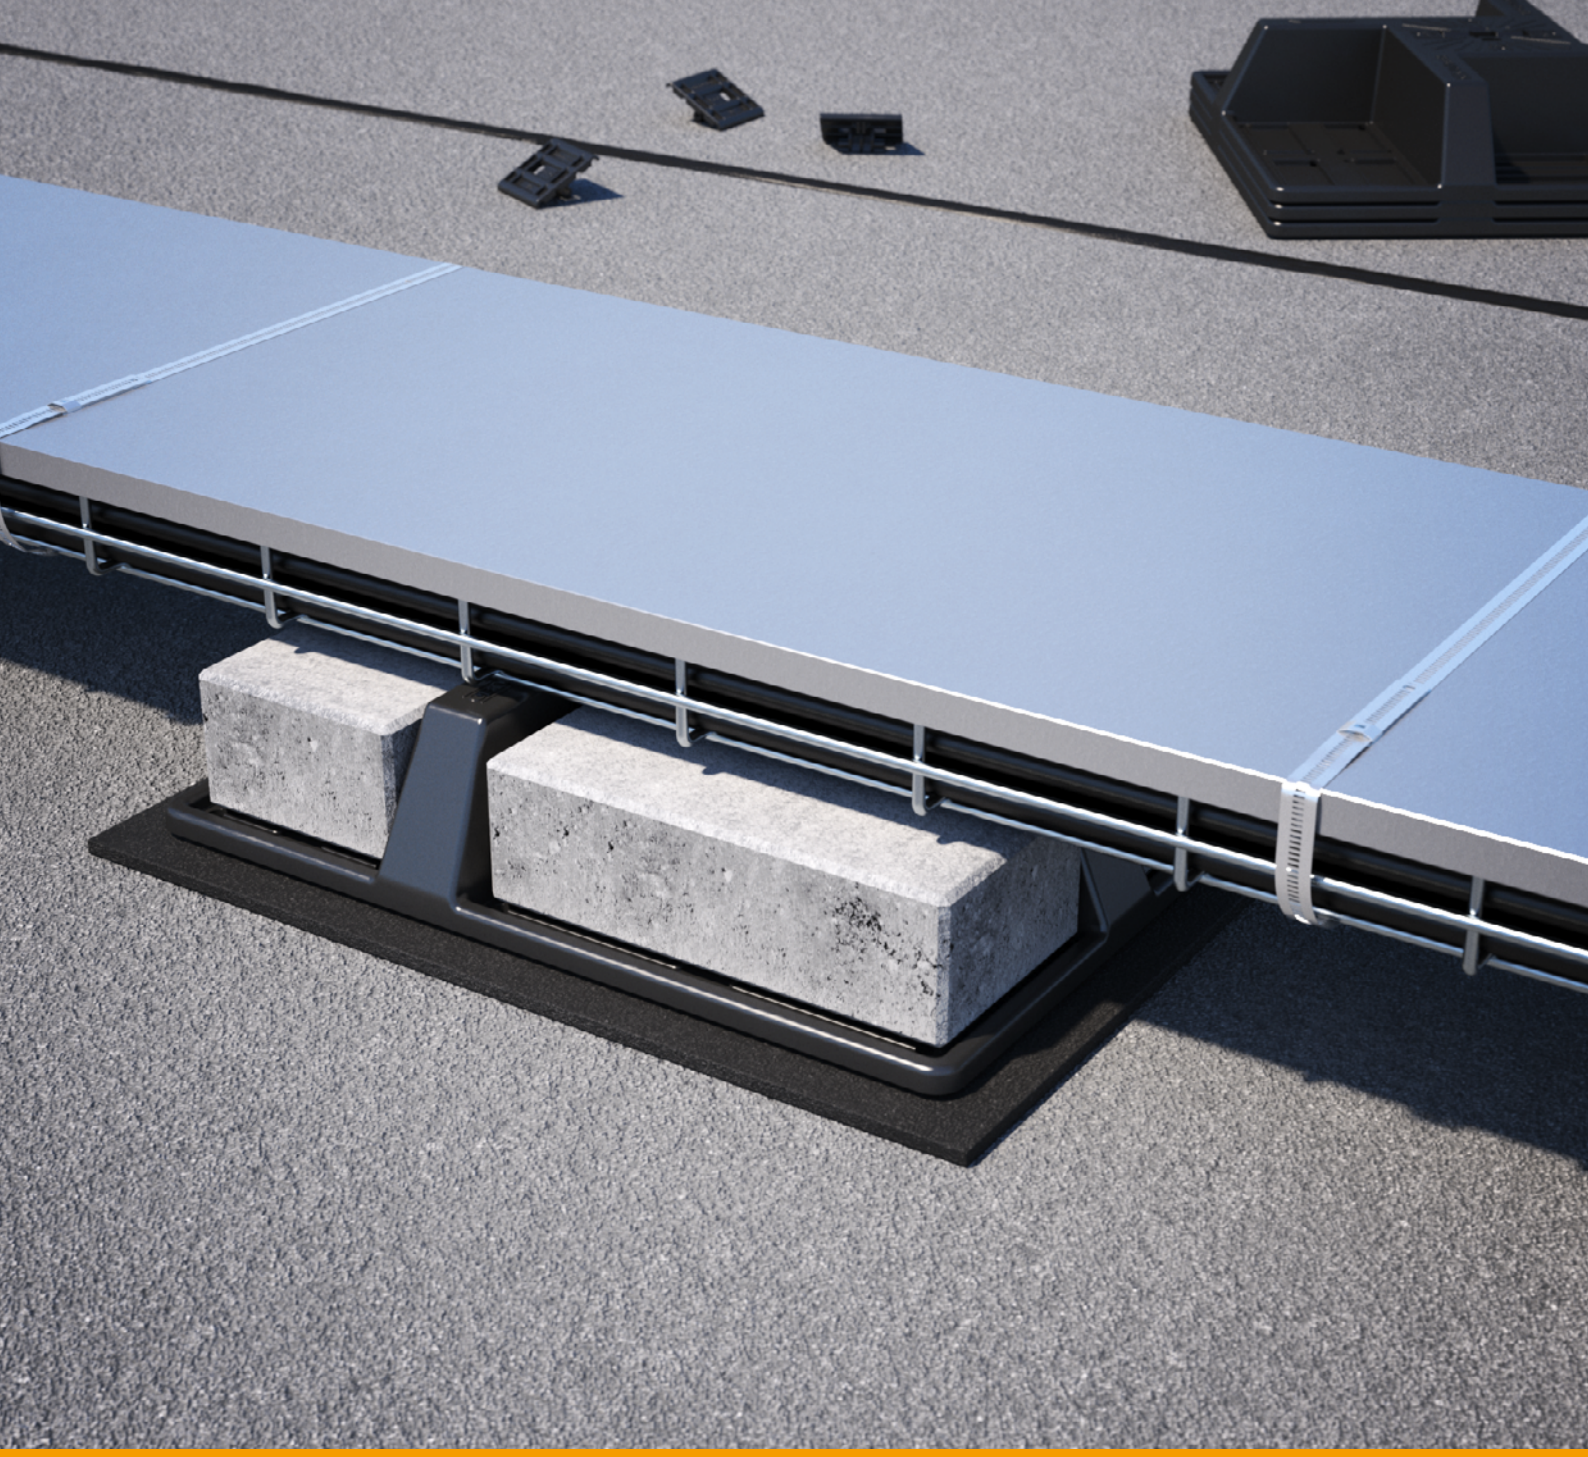


Projekterfassungsbogen

Cable Management

Building Connections

OBO BETTERMANN

Projekterfassungsbogen Cable Management

Bauvorhaben / Projekt	
Name / Kunde	
Projektname	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort / Land	

Geländekategorie auswählen



☐ **Geländekategorie 1**
Offene See, See mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung und glattes, flaches Land ohne Hindernisse



☐ **Geländekategorie 2**
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. landwirtschaftliche Gebiete




☐ **Geländekategorie 3**
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete und Wälder



☐ **Geländekategorie 4**
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet

Eindeckung

Unter Umständen sind entsprechende Nachweise zum Haftreibbeiwert zu erbringen. Zur Nachweisführung kann unser Reibwertmessgerät mit Art.-Nr. 5901990; Typ MG RBKOEFF inkl. dazugehörigem Messprotokoll genutzt werden.



☐ **Folie**



☐ **Kies**



☐ **Bitumen**




☐ **Beton**




☐ **Gründach (extensiv)**

Sonstiges	

Montagesystem

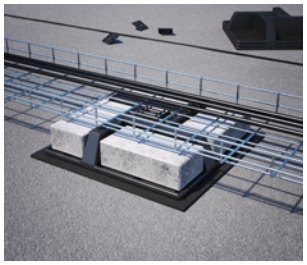

☐ **UniBase 6**

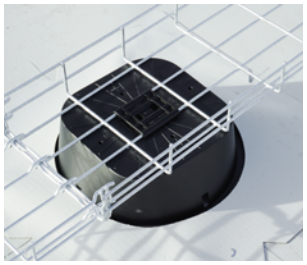

☐ **UniBase Glue**




☐ **TrayFix**



☐ **165 MBG**

Projekterfassungsbogen Cable Management

Flachdach

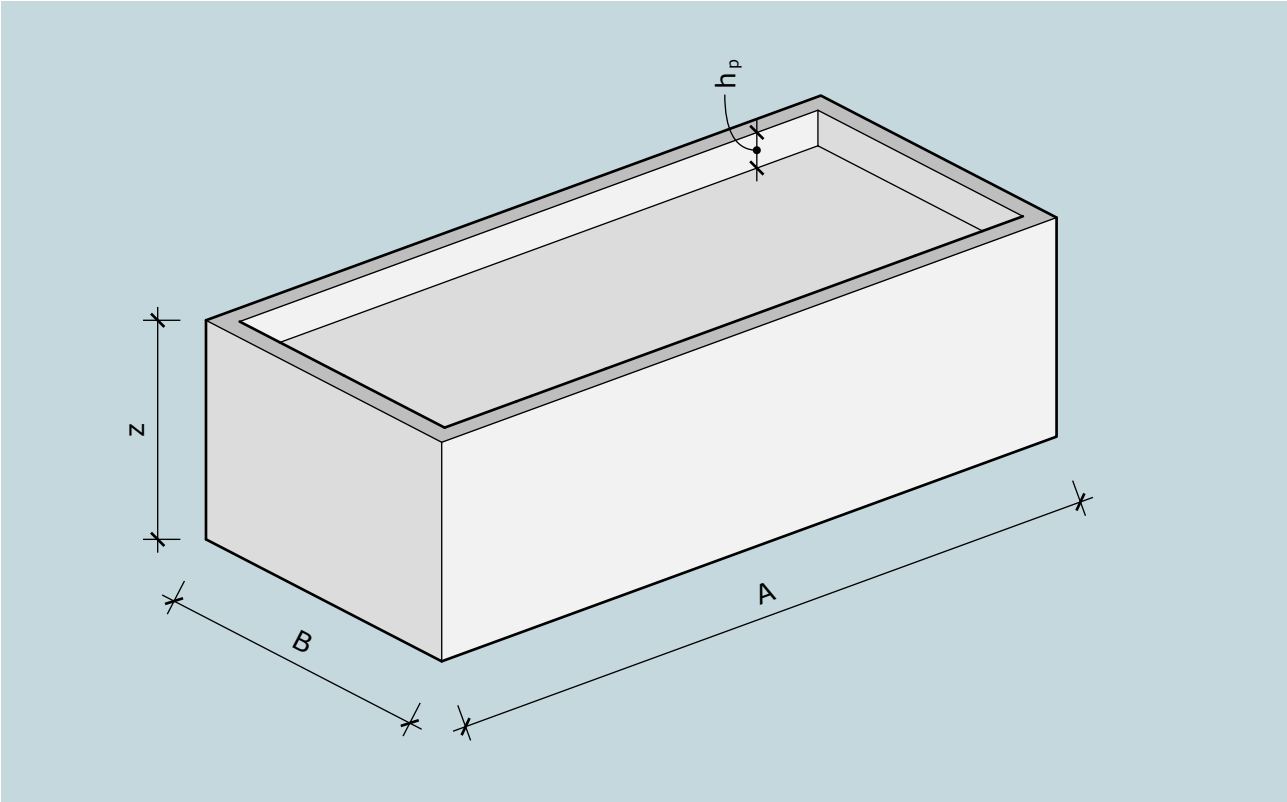

Bitte beachten Sie, dass unsere allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.


Dachname	
Dachlänge [A]	
Dachbreite [B]	
Dachgefälle [%]	
Gebäudehöhe [Z]	
Attikahöhe [h_p]	
Attikabreite	

Projekterfassungsbogen Cable Management


Flachdach | Kabeltragsystem

System / Typ	
Dimensionen B x H [cm]	
Deckel	☐ **ja** ☐ **nein**
Kabelgewicht [kg/m]	
Stützabstand [m]	


Deckelvarianten

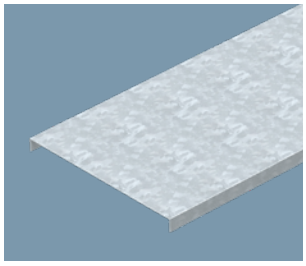

☐ **Deckel, ungelocht**

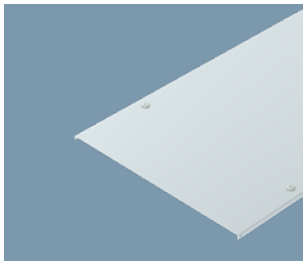


☐ **Deckel mit Drehriegel**

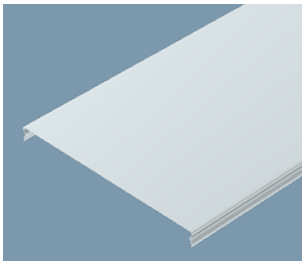


☐ **Deckel, rastbar (für Gitterrinne)**


Sicherungsmaßnahmen

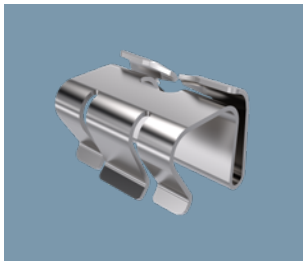

☐ **Deckelklammer**

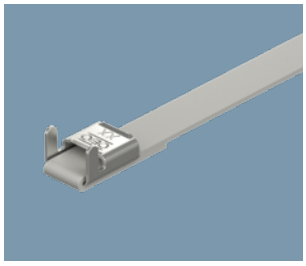

☐ **Spannband / Metallbandschelle**



☐ **Bohrschraube**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ausarbeitung Zeit nehmen.
Um Ihre Konfiguration schnellstmöglich zu erstellen, lassen Sie uns bitte die vollständig ausgefüllte Checkliste inkl. 2D- bzw. 3D-Planungsdateien (bspw. Montagepläne o. ä.) per E-Mail an technical-office@obo.de zukommen!

Die Nachweise zu Lagesicherheit und Tragfähigkeit des Systems werden durch interne fachliche Prüfung wie auch weiteren statischen Berechnungen geführt. Die Bemessungsregeln entsprechenden dabei den aufgeführten Grundlagen der Berechnung. Einzelne Daten und Ergebnisse müssen im Hinblick auf die Gegebenheiten vor Ort abschließend verifiziert und von einer fachlich hinreichend qualifizierten Person geprüft werden.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: **www.obo.de/de-de/wissen/ratgeber/kts-leitfaden/windlast**

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann 06/2026 DE

Building Connections

OBO BETTERMANN
